

جمهورية العراق  
وزارة التخطيط والتعاون الإثمائي  
الجهاز المركزي للإحصاء  
غرفة عمليات التعداد



## التقرير الدوري التاسع لإنجازية عمل القطاعات ضمن مشروع التعداد العام للسكان والمساكن

قطاع التوثيق والمتابعة  
للفترة

من 2010/1/1

لغاية 2010/1/30

## المحتويات

1.....	خلاصة التقرير
1.....	النتائج والتوصيات
1.....	الغرض من التقرير
2.....	إنجازية العمل على مستوى القطاع
3.....	قطاع العمل الفني
3.....	قطاع العمل الميداني
4.....	قطاع الخرائط
4.....	قطاع التدريب
5.....	قطاع الإدخال ومعالجة البيانات
6.....	قطاع المتابعة والدعم الفني والشبكات
6.....	القطاع الإداري
6.....	القطاع القانوني
6.....	قطاع قواعد البيانات وإستخراج التقارير والنشر الالكتروني
7.....	القطاع المالي
8.....	القطاع الإعلامي
9.....	قطاع السيطرة النوعية
9.....	قطاع التوثيق والمتابعة



### خلاصة التقرير

- 1- تحليل نتائج التعداد التجريبي؛ تم عقد دورة تدريبية متخصصة بالتحليل الديموغرافي وسيتم عقد دورة لاحقة لتهيئة الكوادر الذين تم اختيارهم لعملية تحليل نتائج التعداد.
- 2- بسبب الأوضاع الأمنية لبعض أفضية محافظة نينوى ، تعثر إنجاز بعض الفعاليات الخاصة بقطاع العمل الفني وقطاع العمل الميداني وقطاع الخرائط.
- 3- مازالت إنجازية قطاع الخرائط متعلقة بالنسبة للتعداد التجريبي فيما يخص ربط بيانات الخرائط بالبيانات السكانية واستخراج النتائج على هيئة خرائط غير مكتملة وذلك بسبب قدم الصور الفضائية الموجودة.

### النتائج والتوصيات

نظراً للجهود المبذولة من قبل رؤساء القطاعات وإنشغالهم المستمر بأعمال التعداد ، يقترح إشراك منسق القطاع (الشخص الذي ينوب عن رئيس القطاع أثناء إنشغاله أو غيابه) في أعمال القطاع ويكون فعالاً وله صلاحية على تسليم الإنجازية ويكون ذو معرفة وبتماس مباشر بكل أمور القطاع لكي تضمن عدم التلكؤ والتأخير وبهذا ضمان سير العمل بشكل سلس، وذلك لوجود تأخير في إستلام الإنجازية لبعض القطاعات على الرغم من إبلاغهم بالفترة الزمنية المحددة لإستلام الإنجازية رغم الإتصالات الكثيرة لتزويد قطاع التوثيق والمتابعة بالإنجازية.

### الغرض من التقرير

إستمراراً لمتابعة تنفيذ فعاليات الخطط المُعدة من قبل كل قطاع . يتضمن التقرير الدوري التاسع عرضاً لإنجازية تلك الفعاليات وذلك من خلال إعتداد النسبة المئوية لتنفيذ كل فعالية من فعاليات الخطة كمؤشر تفصيلي ، إضافة إلى عرض الإنجازية الإجمالية والتفصيلية لكل قطاع من قطاعات التعداد العام للسكان.



إنجازية العمل على مستوى القطاع

ت	القطاع	إنجازية خطة العمل
1	الفني	منجز
2	الميداني	منجز
3	الخرائط	منجز
4	التدريب	منجز
5	الإدخال ومعالجة البيانات	منجز
6	المالي	منجز
7	القانوني	منجز
8	قواعد البيانات واستخراج التقارير والنشر الإلكتروني	منجز
9	التوثيق والمتابعة	منجز
10	المتابعة والدعم الفني والشبكات	منجز
11	الإعلامي	منجز
12	السيطرة النوعية	منجز
13	الإداري	منجز
14	تهيئة الكوادر	غير منجز



### قطاع العمل الفني

إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي حسب الخطة الواردة من القطاع

ت	الفعالية	نسبة إنجاز %	الملاحظات
1	تشكيل لجان التعداد في الوحدات الإدارية	95	- نتيجة الأوضاع الأمنية لم يتم تشكيل اللجان في ثلاثة أفضية بين محافظة نينوى وإقليم كردستان - نتيجة الأوضاع الأمنية لم يتم تشكيل لجان الأفضية والنواحي لمحافظة كركوك
2	تحليل نتائج التعداد التجريبي	لم تتحقق	لم يتم العمل وإنما تم عقد دورة تدريبية متخصصة بالتحليل الديموغرافي وسيتم عقد دورة لاحقة لتهيئة الكوادر الذين تم إختيارهم للعمل

### محاضر الإجتماع

لم يتم تزويدنا بمحاضر إجتماع

### قطاع العمل الميداني

إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي حسب الخطة الواردة من القطاع

ت	الفعالية	نسبة الإنجاز %	الملاحظات
1	متابعة عمليات الحصر في الريف من خلال قيام رؤساء فرق الإسناد المركزي بزيارات ميدانية وتدقيق سجلات الحصر ميدانيا	100	باستثناء مركز محافظة نينوى (حيث أنجز منه 35%)
2	تم إجراء عمليات التدقيق البعدي وذلك بإيفاد مجموعة من رؤساء فرق الإسناد المركزي من المحافظات الوسطى والجنوبية إلى المنطقة الشمالية ومجموعة من فرق إسناد المنطقة الشمالية إلى المناطق الوسطى والجنوبية حيث تم التدقيق باختيار عينة من السجلات دقت مكتبيا وميدانيا	100	باستثناء مركز قضاء نينوى

### محاضر الإجتماع

لم يتم تزويدنا بمحاضر إجتماع



قطاع الخرائط

إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد التجريبي حسب الخطة الواردة من القطاع

ت	الفعالية	نسبة الانجاز %	الملاحظات
1	ربط بيانات الخرائط بالبيانات السكانية واستخراج النتائج على هيئة خرائط	لم تتحقق	وذلك لعدم الصور الفضائية الموجودة
2	الربط واستخراج النتائج	لم تتحقق	وذلك لعدم الصور الفضائية الموجودة

إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي حسب الخطة الواردة من القطاع

ت	الفعالية	نسبة الانجاز %	الملاحظات
1	تحديد حدود المقاطعات الريفية والتجمعات القروية داخل المقاطعة	95	لم يتم إكمال الأعمال في محافظة نينوى لسوء الوضع الأمني
2	تحديث الخرائط الحضرية وفق عملية الحزم والترقيم والحصص	لم تتحقق	يعتمد على عملية استلام الخرائط من الميدان
3	تحديث الطبقات الجغرافية وفق الصور الحديثة	لم تتحقق	يعتمد على عملية التجهيز بالصور الفضائية

محاضر الإجتماع

لم يتم تزويدنا بمحاضر إجتماع

قطاع التدريب

إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة من القطاع

ت	الفعالية	نسبة الانجاز %	القطاع المنفذ
1	دورة التدقيق المكتبي (الوجبة الأولى)	100	الإدخال ومعالجة البيانات

محاضر الاجتماع

ت	التاريخ	أسماء الحضور	الهدف من الاجتماع	النتائج والتوصيات
1	1/19	- د كاظم محمد بريسم رئيس قطاع التدريب - السادة أعضاء القطاع	الاستعداد والتحضير للاجتماع الذي سيعقد يوم 2010/1/24 بخصوص التعداد وسيتم مناقشة ما تم انجازه من مراحل العمل وحسب القطاعات المعنية بالتعداد	- تكليف السيدة رغد بإعادة النظر بالتقرير المعد سابقاً في شهر كانون الأول/2009 وتصحيح الفروقات بين التقرير وإجابات المحافظات، وإعداد عرض ما تم انجازه في القطاع والمشاكل والمعوقات التي رافقت التنفيذ - التأكيد على مدراء الإحصاء بضرورة إرسال الاستمارة المرسله إليهم بعد ملئها بالمعلومات المطلوبة - تكليف السيدة رغد بتهيئة تقرير تقييم دورة مجموعة التدقيق المكتبي/ الوجبة الأولى التي عقدت بتاريخ 1/4 لغاية 1/21 مع ذكر المقترحات التطويرية لتجاوزها في تدريب المجموعة (عدم الثانية مع تثبيت الملاحظة) (عدم إشراك قطاع التدريب في تحديد مواعيد انعقاد الدورات ويتم إعلام القطاع قبل فترة قريبة جداً أو بعد انعقاد الدورة) وتقديم هذه الملاحظة إلى الإدارة التنفيذية للتعداد



قطاع الإدخال ومعالجة البيانات  
إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة من القطاع

ت	الفعالية	نسبة الانجاز %	الملاحظات
1	تهيئة وتدريب كوادر العمل ( تدقيق مكثبي )	90	هناك تأخير ويعود إلى الأسباب التالية؛ - عدم إكمال دليل الوحدات الإدارية لكل المحافظات - عدم وصول السجلات في موعدها للمركز
2	التدقيق المكثبي للسجلات ومطابقتها مع الأطر	لم تتحقق	لنفس الاسباب السابقة
3	الإدخال الإلكتروني لأغلفة السجلات	لم تتحقق	لنفس الاسباب السابقة
4	إعداد برامج استثمار الفنادق	30	لم يطرأ تغيير على الإنجازية ولكن تم إعداد البرامج لمرحلة الماسح على الاستثمار الحالية
5	دراسة استخدام بصمة الإبهام وموائمتها مع استثمار السكان	30	تم زيارة إحدى الشركات المتخصصة في تركيا للاطلاع على التقنيات المستخدمة في هذا المجال وحالياً تجري دراسة الموضوع من قبل القطاع والخبراء والإدارة التنفيذية
6	تعديل استثمار السكان وتعليماتها	لم تتحقق	هناك نقاشات حول التعديل في استثمار السكان
7	إعداد برامج استثمار عد الجاليات	لم تتحقق	يتم تهيئة تقرير بهذا الخصوص
8	تهيئة وتدريب كوادر الإدخال والمعالجة	لم تتحقق	لحين إكمال أعمال نصب وتجهيز بناية مركز الإدخال والمعالجة
9	تهيئة وتدريب كوادر العمل في الترميز الآلي والإدخال الأبجدي	لم تتحقق	لحين إكمال أعمال نصب وتجهيز بناية مركز الإدخال والمعالجة
10	تم وضع مخطط توزيع نقاط الشبكة لبنانية مركز الإدخال والمعالجة بالتنسيق مع قطاع الدعم الفني والشبكات والشركة المجهزة	100	
11	تم وضع هيكلية مركز بناية الإدخال والمعالجة	100	
12	تمت عملية الإدخال الأبجدي للأسماء فيما يخص السكان بعد أن تم الانتهاء من المباني للأيام في 1/17 لغاية 1/19	100	
13	فيما يخص مراحل القطاع تجري عملية التعديل على البرامج والتقارير إضافة إلى تفعيل تراخيص برنامج التعرف الذكي لمستخدم واحد وخمسة مستخدمين في مرحلة الماسح الضوئي	100	

محاضر الاجتماع

لم يتم تزويدنا بمحاضر إجتماع



قطاع المتابعة والدعم الفني والشبكات

إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة من القطاع

ت	الفعالية	نسبة الانجاز %	الملاحظات
1	تهيئة وإنشاء وتنفيذ شبكة ومعدات وبرمجيات مركز نظم المعلومات الجغرافية (وضع المواصفات التفصيلية لغرض إعلان مناقصة شراء الأجهزة والمعدات والبرمجيات مع وضع الضوابط الخاصة بمراحل المشروع)	95	ضمن السقف الزمني
2	تهيئة وإنشاء شبكة ومعدات وبرمجيات الإدخال والمعالجة (الكرادة) (الاشتراك مع الشركة التي سيتم التعاقد معها في جميع مراحل تنفيذ المشروع من الفحص والتنصيب ومعالجة المشاكل)	5	ضمن السقف الزمني
3	تهيئة، إنشاء وتنفيذ البيئة التجريبية لشبكة الإدخال والمعالجة وشبكة المعالجة واستخراج التقارير (المرحلة الثانية)	100	
4	إدارة مشروع شبكات البيئة التجريبية	-	الفعالية خالية من الإنجازية لأنها يومية ومستمرة لتوفير الدعم الفني لقاعة التعداد التجريبي لحين انتهاء العمل بالمرحلة الثانية

محاضر الإجتماع

لم يتم تزويدنا بمحاضر إجتماع

القطاع الإداري

لم يتم تزويدنا بالإنجازية

القطاع القانوني

لم يتم تزويدنا بالإنجازية لحين إنتهاء التقرير.

محاضر الإجتماع

لم يتم تزويدنا بمحاضر إجتماع.

قطاع قواعد البيانات وإستخراج التقارير والنشر الالكتروني

أكمل القطاع كافة إنجازياته بالنسبة للتعداد التجريبي

محاضر الإجتماع

ت	التاريخ	أسماء الحضور	الهدف من الاجتماع	النتائج والتوصيات
1	1/5	- السيدة خلود العبيدي - أعضاء القطاع	وضع خطة عمل مستقبلية للقطاع	- مراجعة الأعمال المنجزة - التهيئة لخطة عمل مستقبلية - الحاجة إلى موظفين (مبرمجين) وتدريبهم - التقويم اللغوي



## التعداد العام للسكان والمساكن


### القطاع المالي

جدول 1 : المصروفات وفق قنوات الإنفاق المثبتة خلال عام 2009

المجموع	الفصل الرابع	الفصل الثالث	الفصل الثاني	الفصل الأول	الفعالية
19358	3316.3	5701.4	9290.8	1049.4	المصروفات (مليون دينار عراقي)
17011	8558.2	2011.5	5651.7	789.1	السلف الممنوحة (مليون دينار عراقي)
725	157.0	256.8	179.4	128.9	الرواتب المصروفة للمتعاقدین (مليون دينار عراقي)
2144	448	346	254	1096	سندات الصرف (عدد)
138	81	24	21	12	سندات القيد (عدد)
5	-	-	2	3	الكشوفات المالية (عدد)

جدول 2 : نسب المصروفات وفق قنوات الإنفاق المثبتة لشهر كانون الثاني من عام 2010

المبلغ	الفعالية
83537817	المصروفات (دينار عراقي)
76470000	السلف الممنوحة (دينار عراقي)
69167000	الرواتب المصروفة للمتعاقدین (دينار عراقي)

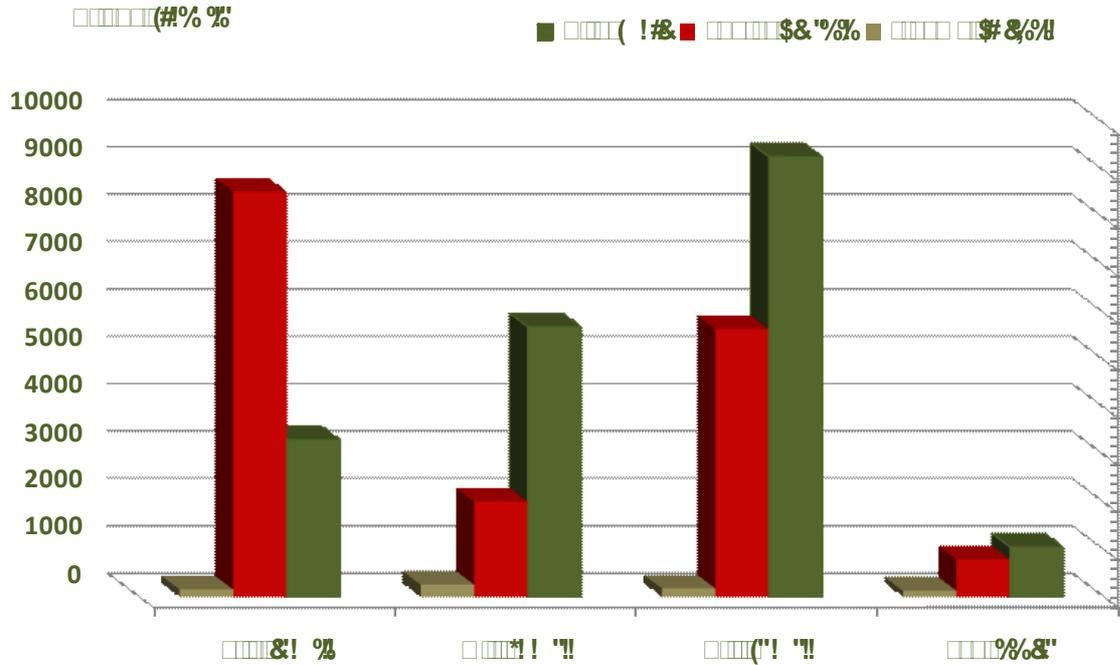

شكل 1: شكل بياني يوضح مقدار المصروفات والسلف الممنوحة والرواتب المصروفة للفترة من 12/1 ولغاية 2009/12/31 ومقارنة بالفصول السابقة



## التعداد العام للسكان والمساكن

جدول 3 : نسب المصروفات وفق قنوات الإنفاق المثبتة وكذلك النسب المتبقية منها خلال عام 2009

اسم الحساب	نسبة المصروف	نسبة المتبقي
مكافأة المنتسبين	51.1	48.9
أجور المتعاقدين	81.0	19.0
أجور المحاضرات	82.6	17.4
مخصصات الخطورة	0.2	99.8
الأعمال الإضافية	96.0	4.0
السلف الممنوحة*	19.8	3.0
المكافآت لغير المنتسبين	55.2	44.8

\* حيث تم تدوير المبلغ للسنة الجديدة.

- نسبة المصروف من ميزانية التعداد (بضمنها السلف) : 46.5 %
- نسبة المتبقي من ميزانية التعداد (بضمنها السلف) : 53.5 %

### محاضر الإجتماع

لم يتم تزويدنا بمحاضر إجتماع .

### القطاع الإعلامي

إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة من القطاع

ت	الفعالية	نسبة الانجاز %	الملاحظات
1	إجراء لقاء صحفي موسع مع وكالة رويتر	100	
2	نشر تقريران صحفيان عن عمليات الترقيم والحصص في نينوى	100	
3	نشر تقرير في الصحف حول إجراء التعداد في عام 2010	100	
4	نشر تقرير صحفي عن عمليات الترقيم والحصص	100	
5	التغطية الإعلامية للاجتماع السادس للهيئة العليا للتعداد العام للسكان	100	
6	عقد مؤتمر صحفي لوزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزي عن عمليات الترقيم والحصص	100	
7	إجراء اللقاءات التلفزيونية عن التعداد ، كان عدد اللقاءات (13) لقاء	100	
8	إجراء لقاءات إذاعية عن التعداد العام للسكان ، وبعدد (8) لقاءات	100	

### محاضر الاجتماع

لم يتم تزويدنا بمحاضر إجتماع



قطاع السيطرة النوعية

إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي حسب الخطة الواردة من القطاع

ت	الفعالية	نسبة الانجازية %	الملاحظات
1	تدريب مشرفي إقليم كردستان على أعمال قطاع السيطرة النوعية في محافظة بغداد ومرافقتهم في زيارات ميدانية إلى محافظات الوسط والجنوب	100	تم إنجاز العمل بالتعاون مع القطاع الميداني
2	تدريب عدد من المشرفين على أعمال قطاع السيطرة النوعية في محافظة بغداد ومرافقتهم في زيارات ميدانية إلى إقليم كردستان	100	تم إنجاز العمل بالتعاون مع القطاع الميداني

محاضر الإجتماع

لم يتم تزويدنا بمحاضر إجتماع

قطاع التوثيق والمتابعة

إنجازية القطاع

ت	الفعالية	نسبة الانجاز %	الملاحظات
1	تم إصدار التقرير الدوري الثامن لإنجازية عمل القطاعات ضمن مشروع التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2009 .	100	إرسال نسخة إلى السيد رئيس غرفة عمليات التعداد ، كذلك نسخ إلى كل من الإدارة التنفيذية للتعداد ورؤساء القطاعات كافة والنشر الإلكتروني وتم إمامها إلى مديريات الإحصاء في المحافظات، كما تم إطلاق تقرير عن إنجازية عمل القطاعات ضمن مشروع التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2009 باللغة الإنكليزية.
2	المتابعة المستمرة لإنجازية عمل قطاعات التعداد	100	
3	تولى أعضاء القطاع توثيق كافة فعاليات وأنشطة التعداد ضمن نظام الأرشفة	100	
4	تم الحصول على شهادة مشاركة في دورة الإدارة الوسطى وتأهيل القيادات الإدارية لإحدى أعضاء القطاع ( الأنسة حلا مثنى) ضمن الدورة التي أقيمت في اسطنبول.	100	تناولت الدورة ثلاثة محاور ؛ - وظائف الإدارة المعاصرة - إدارة المعرفة - إدارة أعمال السكرتارية التنفيذية ومن ضمنها هيكلية التقارير وكيفية كتابتها بالوقت الحاضر



محاضر الاجتماع

التاريخ	أسماء الحضور	الهدف من الاجتماع	النتائج والتوصيات
1/17	- رئيس القطاع - أعضاء القطاع	- مناقشة ما أنجزه القطاع من نشاطات رئيسة متمثلة بتقديم التقارير الدورية الشهرية عن إنجازات القطاعات الأخرى والإشكالات التي واجهت عمل كل قطاع من القطاعات المكونة للتعداد	تم التأكيد من قبل السيد رئيس القطاع على الإستمرار بنفس الروحية والنشاط لإنجاز أعمال ومهام القطاع شاكراً الكادر على ما أنجزه من مهام. التأكيد على ضرورة توثيق إنجازات ونشاطات القطاعات الأخرى وبإتماد المراسلات المكتوبة فضلاً عن التأكد من المعلومات المدرجة في تقارير القطاعات سواء عبر المراسلات أو في المتابعة الميدانية وعدم تثبيت أي معلومة في التقرير إلا بعد التأكد من صحتها.
		-	أستفسر السيد رئيس القطاع من كل عضو من أعضاء القطاع عن أعمالهم والقطاعات المكلفات بمتابعة أعمالها مؤكداً على ضرورة إدامة الصلة الوظيفية مع تلك القطاعات.
		-	من خلال المتابعة ظهر إن هناك تأخير في إستلام الانجازية لبعض القطاعات، علماً انه تم التبليغ عن الفترة الزمنية التي يجب إن تسلم الانجازية خلالها، والتي أحد أسبابها منسق القطاع (الذي ينوب عن رئيس القطاع) لعدم أمكانيته بتسليم الإنجازية لحين أخذ الأذن بذلك مما يؤدي الى التأخير.
